

BEME SAUDI PROJET

DOCUMENT DE TRAVAIL · VERSION 3 · 4 NOVEMBRE 2026

Projet Arabie saoudite

BEME Saudi : conception, trois étapes et scénarios de partenariat

Une filiale saoudienne de BME (Dubaï), déployée en 36 mois : ce qu'on construit, ce qu'il faut engager à chaque étape, à quel volume de ventes on atteint l'équilibre, et ce que nous devons encore arrêter.

BONGARD · HYDROPROCESS · PVLAB

SOMMAIRE

	Résumé exécutif	p. 2
1	Ambition, vision et mission	p. 3
2	Le marché	p. 4
3	Notre proposition	p. 5
4	Feuille de route et expansion	p. 6
5	Le dispositif retenu	p. 7
6	Les trois étapes, et (10) le passage de l'une à l'autre	p. 8
7	Étape 1 : Riyad, le showroom vivant	p. 9 à 10
8	Étape 2 : Jeddah et l'agent Est	p. 11
9	Étape 3 : les agents certifiés	p. 11
11	Ce qu'il faut engager à chaque étape	p. 12
	Synthèse : à quel volume de ventes atteint-on l'équilibre ?	p. 13
13	Faisabilité : quatre scénarios de ventes	p. 14 à 15
14	Scénarios de départ et de répartition	p. 16
15	Points à arrêter	p. 17

Tous les montants sont en riyals saoudiens (SAR). Les hypothèses sont signalées comme telles et doivent être confirmées.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Construire en Arabie saoudite, en trois étapes

BEME Saudi veut passer de « servir l'Arabie saoudite » à « construire en Arabie saoudite » : une filiale locale, déployée en trois étapes sur 36 mois. Elle demande 5,4 M SAR à engager pour la première étape (4,69 M SAR d'investissement et trois mois de trésorerie) et 10,1 M SAR pour les trois étapes, marketing et stock compris.

ÉTAPE 1 · RIYAD

5,42 M

SAR à engager. Investissement 4,69 M plus trois mois de trésorerie.

ÉTAPE 2 · JEDDAH

+4,43 M

SAR en plus. Second showroom et premier agent.

ÉTAPE 3 · AGENTS

+0,30 M

SAR en plus. Trois agents certifiés. Total : 10,15 M SAR.

Ce que c'est	Une filiale saoudienne de BME (Dubaï) pour vendre, installer, former et assurer le SAV des équipements Bongard, HydroProcess et PVLAB.
Le déploiement	Riyad (mois 0 à 12), puis Jeddah et un premier agent (mois 12 à 24), puis trois agents de plus (mois 24 à 36).
Ce qu'il faut engager	Étape 1 : 5,42 M SAR. Étape 2 : 4,43 M de plus. Étape 3 : 0,30 M de plus. Soit 10,15 M SAR pour les trois étapes (page 12).
Les formules ouvertes au partenaire	Distributeur autonome, ou joint-venture avec un partenaire financier (100 %, 50 % ou 30 %). L'agent à commission est écarté : la politique commerciale de Bongard ne le permet plus.
Ce qui reste à fixer	Les ventes attendues : projets signés et en cours en Arabie saoudite (page 17).

COMMENT LIRE CE DOSSIER

La page 13 résume à quel volume de ventes le réseau atteint l'équilibre. Le dossier suit une progression : la vision (pages 3 à 6), le dispositif et son chiffrage par étape (pages 7 à 12), la synthèse et les scénarios de ventes (pages 13 à 15), puis les manières d'entrer dans le projet et les points à arrêter (pages 16 et 17).



1 · AMBITION, VISION ET MISSION

Une présence permanente, avec le bon partenaire local

L'ambition de BEME Saudi tient dans sa phrase d'ouverture : passer de servir l'Arabie saoudite à y construire une présence permanente, d'abord à Riyad, avec le bon partenaire local.

L'objectif n'est pas de vendre plus de machines. Il est de rapprocher des professionnels saoudiens l'expertise, la réactivité et l'engagement de long terme de BEME, et de bâtir une plateforme qui grandit avec l'industrie culinaire du Royaume aux standards internationaux.

Ambition	De l'opportunité à une présence durable en Arabie saoudite
Mission	Apporter aux boulangers, pâtissiers, chefs et industriels saoudiens le savoir-faire derrière la machine : conseil, démonstration, installation, formation, maintenance et pièces détachées, au même endroit
Vision à long terme	Une destination pour l'expertise culinaire, la technologie, l'innovation et le développement professionnel en Arabie saoudite
Positionnement	Ingénierie internationale. Expertise locale. Partenariat de long terme
Valeurs	Proximité, expertise, partenariat, développement

LE PROJET NE PART PAS DE ZÉRO

Depuis 2018

BME Middle East est présent dans la région et sert déjà le marché saoudien depuis Dubaï et la France, avec une base installée, des relations clients et une expérience du service après-vente.

Depuis 1922

Bongard, fabricant français, se tient derrière BME : plus d'un siècle d'ingénierie, de formation et de support technique.

Les références clients à afficher (MAF, LULU, PANDA, HERFY, PIERRE HERMÉ, MAISON KAYSER, CROÏ BAKEHOUSE, OLBA, et d'autres projets de boulangerie premium) doivent être confirmées avec leur accord avant toute diffusion.

2 · LE MARCHÉ

L'équipement est là, l'expertise doit se rapprocher

L'Arabie saoudite a déjà accès à une large gamme d'équipements internationaux de boulangerie, de pâtisserie et de restauration. Ce qui manque n'est pas la machine : c'est la distance entre le client et l'expertise qui l'accompagne.

CE QUI MANQUE AUJOURD'HUI	CE QUE CELA COÛTE AU CLIENT	CE QU'APPORTE UNE PRÉSENCE LOCALE
Délais d'import, d'expédition et de douane	Des projets plus longs et moins prévisibles	Stock local et coordination logistique sur place
Distribution généraliste multi-marques	Une expertise fabricant difficile à trouver localement	Techniciens formés sur les marques représentées
Dépendance à l'approvisionnement international pour les pièces critiques	Une machine à l'arrêt, donc de la production perdue	Stock de pièces critiques dimensionné sur la base installée
Peu de démonstration, de formation et d'accompagnement d'application	Des choix d'équipement moins sûrs	Showroom vivant, essais, formations
Une relation limitée à la transaction	Pas de suivi après la livraison	Un interlocuteur, de la définition du projet à la maintenance

Une machine peut se vendre en un jour. Une relation professionnelle se construit sur toute la durée de vie de l'équipement.

QUATRE CAPACITÉS QUE LA DISTANCE EMPÊCHE

Un interlocuteur visible
Responsable et présent dans le Royaume.

Contracter localement
En riyals, selon la structure juridique retenue.

Une réponse plus rapide
Moins d'intermédiaires entre le client et la solution.

Une escalade directe
Vers les ressources techniques du fabricant, y compris le diagnostic à distance quand l'équipement est connecté.

3 · NOTRE PROPOSITION

Du fournisseur d'équipement au partenaire de projet

BEME Saudi couvre tout le parcours d'un projet professionnel, pas seulement la livraison.

1	**Conseiller**	Comprendre le concept, les volumes et les contraintes d'exploitation
2	**Concevoir et spécifier**	Flux de production, plan du laboratoire, choix de l'équipement et de sa configuration
3	**Démontrer et tester**	Faire fonctionner les machines devant le client, essais produit dans le showroom
4	**Fournir, installer, mettre en service**	Logistique, livraison, installation sûre, mise en route
5	**Former**	Transférer le savoir-faire aux chefs, aux équipes de production et aux techniciens
6	**Maintenir et fournir les pièces**	Maintenance préventive et corrective, disponibilité des pièces critiques et courantes
7	**Accompagner**	Relation technique et commerciale pendant toute la vie de l'équipement

UN PORTEFEUILLE DE MARQUES CHOISIES



Bongard
La pierre angulaire de l'offre boulangerie-pâtisserie.



HydroProcess
ChefCut®, découpe à jet d'eau de précision.



Marque à définir
Chocolat : tempérage, enrobage, moulage.



PVLAB
Robot à crème pâtissière.

L'ambition n'est pas un catalogue sans limite : chaque fabricant doit ajouter une capacité claire, soutenue par une vraie expertise. Toute marque supplémentaire n'entre qu'après confirmation de ses droits.

UN ÉCOSYSTÈME CULINAIRE À MOYEN TERME

Au-delà de la distribution, BEME Saudi peut relier les fabricants d'équipement, les partenaires ingrédients (farine, chocolat, beurre, fruits), les chefs et Meilleurs Ouvriers de France du réseau, les clients et entrepreneurs, la formation et les masterclasses, la R&D produit et le conseil de projet. C'est un lieu pour découvrir, tester, apprendre, créer, développer et échanger. Il se construit après la preuve de Riyad, pas avant.

Cinq phases, dont quatre chiffrées sur 36 mois

La feuille de route de BME enchaîne cinq phases, de la vente locale à l'option d'assemblage industriel. Ce dossier chiffre les quatre premières sur 36 mois ; la cinquième reste une option sans engagement.

1 Établir Riyad

Créer la présence saoudienne, la proximité client, la capacité commerciale locale, le support technique spécialisé et la première plateforme physique.

Étape 1

2 Étendre dans le Royaume

Développer la clientèle, évaluer d'autres sites : Jeddah comme prochain pôle, un troisième site possible selon la demande et l'économie.

Étape 2

3 Construire l'expérience et le savoir

Démonstration, formation, masterclasses, collaborations avec des chefs, partenariats ingrédients, R&D, événements.

Commence dans le showroom de l'étape 1, s'amplifie ensuite

4 Passer à l'échelle

Élargir le portefeuille, les partenariats, le réseau de service et la couverture géographique, sans perdre l'expertise.

Étape 3 : agents certifiés

5 Localiser industriellement

Évaluer l'assemblage local de certains équipements Bongard, sous réserve de volume, d'accord du fabricant, d'économie et des exigences saoudiennes de contenu local.

Hors plan : aucun investissement industriel dans les 36 premiers mois

POURQUOI L'ASSEMBLAGE LOCAL N'EST PAS UN ENGAGEMENT DU PREMIER JOUR

Il demanderait l'accord du fabricant, un volume suffisant, une faisabilité technique, une chaîne d'approvisionnement, des normes de qualité, la formation de techniciens saoudiens et le respect des règles locales. La reconnaissance « Made in Saudi » ne vaut que si tous les critères officiels sont remplis.

5 · LE DISPOSITIF RETENU

Une filiale locale qui vend, installe et entretient en direct

Le projet crée en Arabie saoudite une filiale locale de BME (Bongard Middle East, Dubaï). Elle vend, installe et entretient en direct les équipements de boulangerie-pâtisserie des marques représentées, puis étend son réseau à tout le royaume en 36 mois.

Mission	Devenir l'interlocuteur local de référence des boulangers, pâtissiers et industriels saoudiens : vente, installation, formation, SAV et pièces détachées
Marques	Bongard, PVLAB, HydroProcess (chocolat : marque à définir)
Base juridique	Exclusivité de BME sur le CCG, le Liban, l'Irak, la Syrie, la Palestine, le Yémen et le Soudan ; contrat entre BEME UAE et la filiale saoudienne, agent exclusif pour l'Arabie saoudite ; licence MISA obtenue
Références installées	MAF, LULU, PANDA, HERFY, PIERRE HERMÉ, MAISON KAYSER, CROÏ BAKEHOUSE, OLBA
Réseau	6 zones commerciales, 2 showrooms détenus par la société (Riyad, Jeddah), 4 agents certifiés (Est, Madinah / Nord-Ouest, Qassim / Nord, Sud)
Appui	Hub logistique et technique de Dubaï ; réseau Bongard de plus de 140 distributeurs dans le monde
Durée	Déploiement sur 36 mois, en trois étapes
Plus tard	Option d'assemblage local (aucun investissement industriel dans la première phase)

La vision tient en une phrase : une vitrine vivante à Riyad qui prouve le métier, une seconde à Jeddah qui couvre l'Ouest, puis un réseau d'agents certifiés qui couvre le reste du pays sans multiplier les investissements.


TROIS PILIERS

Voir et tester · Un showroom de 300 m² où le client regarde fonctionner les machines, goûte le résultat et suit une formation.

Servir · Un SAV et un stock de pièces sur place, parce qu'un four à l'arrêt coûte au client chaque jour.

Couvrir · Des agents locaux certifiés dans les zones où un showroom propre ne se justifie pas encore.

LA CARTE DU RÉSEAU

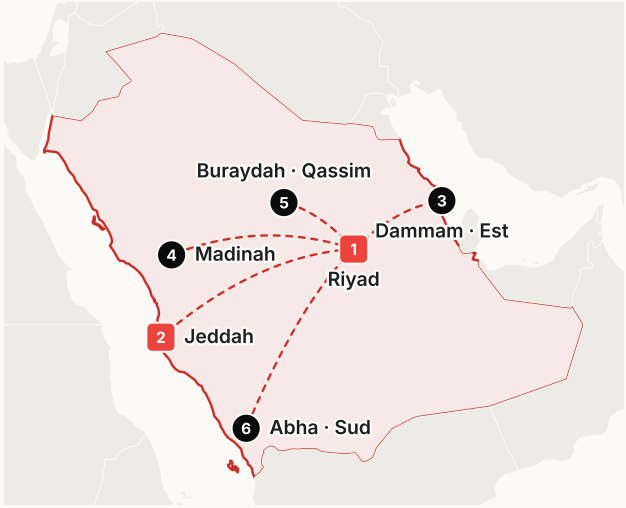

Carré rouge : showroom de la société (Riyad, Jeddah). Rond noir : agent certifié (Est, Madinah / Nord-Ouest, Qassim / Nord, Sud).

6 · LES TROIS ÉTAPES

Trois étapes sur 36 mois

Un premier showroom à Riyad, un second à Jeddah avec un premier agent, puis trois agents de plus. On ne passe à l'étape suivante que si les conditions du passage sont réunies.



ÉTAPE 1 · MOIS 0 À 12

Riyad

Showroom de 300 m², SAV et pièces, équipe de 9 personnes dont 2 au marketing.

5,42 M

Investissement 4,69 M



ÉTAPE 2 · MOIS 12 À 24

Jeddah

Second showroom de 300 m² et premier agent certifié à l'Est.

+4,43 M

Investissement 3,94 M



ÉTAPE 3 · MOIS 24 À 36

Agents

Trois agents certifiés : Madinah / Nord-Ouest, Qassim / Nord, Sud.

+0,30 M

Investissement 0,30 M

Montants à engager en SAR : investissement plus trois mois de coûts fixes en trésorerie, marketing et stock compris (page 12).

10 · COMMENT PASSE-T-ON D'UNE ÉTAPE À L'AUTRE

Nous proposons que chaque étape s'ouvre sur des conditions de passage chiffrées, plutôt que sur une date fixée d'avance. Ces seuils sont une base de discussion, pas une règle arrêtée.

PASSAGE	CONDITIONS PROPOSÉES	POURQUOI
Étape 1 → 2 Jeddah, Est	6 mois au moins depuis l'ouverture de Riyad ; résultat mensuel moyen positif sur les 3 derniers mois ; financement de l'étape 2 acquis (4,43 M SAR)	Éviter d'ajouter 161 879 SAR de coûts fixes par mois avant d'avoir couvert ceux de Riyad
Étape 2 → 3 Trois agents	6 mois au moins depuis Jeddah ; résultat positif sur les 3 derniers mois ; 300 000 SAR disponibles ; premier agent (Est) ayant vendu au moins une machine	Vérifier que le modèle d'agent fonctionne avant de le répliquer
Sortie Arrêt ou réorientation	Aucune vente nationale ferme après 9 mois d'exploitation de l'étape 1	Limiter la perte à l'investissement de l'étape 1

Le rythme de ventes qui permet d'ouvrir l'étape 2 dans les délais est donné par la synthèse (page 13) : à 3 machines par mois, 2,6 projets par an suffisent pour être à l'équilibre en année 2. Si ce rythme n'est pas atteint, l'étape 2 attend, ou un partenaire accepte de la financer à l'avance. Nous devons arrêter ce point (page 17).

7 · ÉTAPE 1 · RIYAD, LE SHOWROOM VIVANT (MOIS 0 À 12)

L'étape 1 pose la preuve

Un showroom de 300 m² avec SAV et pièces détachées, une équipe de 9 personnes dont deux au marketing, pour un investissement de 4,69 M SAR.



300 m²
Showroom vivant, bureaux, salle de réunion connectée, studio podcast, atelier SAV, réserve de pièces

3 mois
De chantier avant l'ouverture

12
Machines en fonctionnement dans le parc de démonstration

POSTE	CE QUE DEMANDE L'ÉTAPE 1	SAR
Travaux	Aménagement des 300 m², loyer 42 683 SAR par mois	1 341 463
Parc de démonstration	12 machines en fonctionnement, représentatives de la gamme (liste à arrêter)	1 800 000
Stock de machines	Quelques machines de série livrables rapidement	300 000
Pièces détachées	Stock de départ, payé à 60 jours (100 k€)	430 000
Informatique et mobilier connecté	Salle de réunion connectée, studio podcast, postes de travail	600 000
Véhicule SAV	1 véhicule d'intervention	100 000
Lancement marketing	Identité visuelle, site, photo et vidéo des machines, première campagne, comptes Instagram et LinkedIn	120 000
Total étape 1		**4 691 463**

Le parc de démonstration pourrait tomber à environ 1,03 M SAR en le valorisant aux prix des offres réelles (au lieu de 1,8 M SAR) ; à confirmer avec les fournisseurs.

9 personnes, 242 299 SAR de coûts fixes par mois

POSTE	EFFECTIF	SAR PAR MOIS
Direction	1	23 783
Responsable d'équipe	1	11 255
Techniciens SAV	3	18 912
Chef de démonstration	1	15 000
Assistant	1	8 333
Marketing (responsable, community manager et contenu)	2	22 000
Total salaires	**9**	**99 283**

LES COÛTS FIXES DE L'ÉTAPE 1, PAR MOIS



Salaires · Loyer · Autres charges · Budget marketing

Avec le loyer (42 683), les autres charges (75 333) et le budget marketing (25 000), les coûts fixes de l'étape 1 sont de 242 299 SAR par mois.

LE MARKETING, UN POSTE À PART ENTIÈRE

Pour un distributeur d'équipements, les ventes naissent de la visibilité autant que du showroom. Le plan prévoit une équipe de deux personnes (un responsable marketing et un community manager qui produit les contenus photo et vidéo, 22 000 SAR par mois) et un budget de 25 000 SAR par mois.

Au programme : Instagram et LinkedIn, publicité ciblée, contenus de démonstration, relations avec les chefs et les prescripteurs, salons et événements du secteur, e-mailing. Le lancement coûte 120 000 SAR.

Sur 36 mois, le marketing pèse environ 1,7 M SAR pour l'étape 1. Ces montants sont des hypothèses de travail.



8 · ÉTAPE 2 · JEDDAH ET L'AGENT EST (MOIS 12 À 24)

Un second showroom : 3,94 M SAR de plus

L'étape 2 ajoute un second showroom de 300 m² à Jeddah et un premier agent certifié à l'Est.

POSTE	CE QUE DEMANDE L'ÉTAPE 2	SAR
Travaux	Aménagement du site à Jeddah, 3 mois de chantier, loyer 42 683 SAR par mois	1 341 463
Parc de démonstration	12 machines	1 800 000
Stock de machines	Complément pour l'Ouest	300 000
Informatique et mobilier	Salle de réunion, studio, postes de travail	300 000
Véhicule SAV	1 véhicule	100 000
Agent Est	Mise en place, certification, outils de démo	100 000
Ajout de l'étape 2		**3 941 463**

Le stock de pièces détachées de Riyad sert aussi Jeddah : la mise de 430 000 SAR n'est pas renouvelée. L'équipe s'agrandit d'un responsable de site et de deux techniciens à Jeddah, soit 23 863 SAR par mois en plus et 123 146 SAR par mois en tout, marketing de Riyad compris.

Un budget marketing régional de 20 000 SAR par mois s'ajoute à l'ouverture (événements, publicité et relais locaux), sans nouvelle équipe : le marketing reste piloté depuis Riyad. Les coûts fixes passent de 242 299 à 404 178 SAR par mois, soit 161 879 de plus.

> Cette étape ne devrait s'ouvrir que si Riyad démontre son rythme de ventes : au volume de base, Jeddah ajoute 161 879 SAR de coûts fixes par mois pour environ 90 000 SAR de marge mensuelle.

9 · ÉTAPE 3 · LE RÉSEAU D'AGENTS CERTIFIÉS (MOIS 24 À 36)

Trois agents de plus : 300 000 SAR

L'étape 3 couvre le reste du royaume avec trois agents, parce que ces agents n'ont ni local ni salarié à la charge de la société.

POSTE	CE QUE DEMANDE L'ÉTAPE 3	SAR
Agent Madinah / Nord-Ouest	Mise en place, certification, outils de démo, ouverture mois 24	100 000
Agent Qassim / Nord	Idem, ouverture mois 24	100 000
Agent Sud	Idem, ouverture mois 30	100 000
Ajout de l'étape 3 : trois agents à 100 000 SAR		**300 000**

Les agents sont rémunérés à la commission (10 % dans le modèle). Leur volume est estimé au prorata de la population de leur zone, avec un coefficient de 0,6 par rapport à un showroom. La formation, le SAV lourd et la fourniture de pièces restent assurés depuis Riyad et Jeddah. Poser la couverture nationale ne demande que 300 000 SAR et n'ajoute aucun coût fixe.

Investissement plus trois mois de trésorerie

Le montant à engager à chaque étape est l'investissement plus une réserve de trésorerie de trois mois de coûts fixes. Le marketing, le stock de machines et les pièces détachées sont déjà inclus. Ce montant ne suppose aucune vente : il dit ce qu'il faut avoir pour ouvrir et tenir le temps que les premières ventes arrivent.

ÉTAPE	INVESTISSEMENT	3 MOIS DE TRÉSORERIE	À ENGAGER	CUMULÉ
1 · Riyad	4 691 463	726 897	**5 418 360**	5 418 360
2 · Jeddah et agent Est	3 941 463	485 637	**4 427 100**	9 845 460
3 · Trois agents	300 000	0	**300 000**	10 145 460

MONTANT À ENGAGER PAR ÉTAPE (SAR MILLIONS)



Réseau complet **10,15 M SAR**

Investissement · Trois mois de trésorerie

La réserve de l'étape 1 est de trois mois de coûts fixes : 242 299 SAR par mois (99 283 de salaires, 118 016 de loyer et de charges, 25 000 de marketing), soit 726 897 SAR. À Jeddah, les coûts fixes augmentent de 161 879 SAR par mois, soit 485 637 SAR pour trois mois ; les trois agents n'ajoutent aucun coût fixe, ils sont payés à la commission.

L'étape 3 mise à part, le montant à engager augmente peu : les gros montants viennent des deux showrooms, pas des agents. Engager l'étape 1 puis l'étape 2 revient à payer presque la totalité du réseau, mais avec la possibilité de s'arrêter entre les deux.

> Les chiffres reposent sur des hypothèses à confirmer : loyer de 42 683 SAR par mois et par showroom, parc de démonstration de 1,8 M SAR, marketing de 47 000 SAR par mois à Riyad (équipe et budget) et 20 000 SAR de plus à Jeddah.


SYNTHÈSE · L'ÉQUILIBRE

À quel volume de ventes atteint-on l'équilibre ?

Être à l'équilibre en année 1, 2 ou 3 signifie que le résultat de l'année, marketing compris, est nul ou positif. Les chiffres sont les rythmes à plein régime du showroom de Riyad (étape 1) : un projet vaut 10 machines pour 2 M SAR, une vente à l'unité 48 164 SAR.

Marge de 35 % sur la vente unitaire et sur les projets (à 30 %, il faut 2,75 projets au lieu de 2,3 pour l'équilibre en année 3, avec 3 machines par mois). Plus on veut atteindre l'équilibre tôt, plus le rythme de projets monte : l'année 1 ne compte que neuf mois d'exploitation après les travaux et une montée en charge progressive sur 12 mois.

PROJETS PAR AN À VENDRE

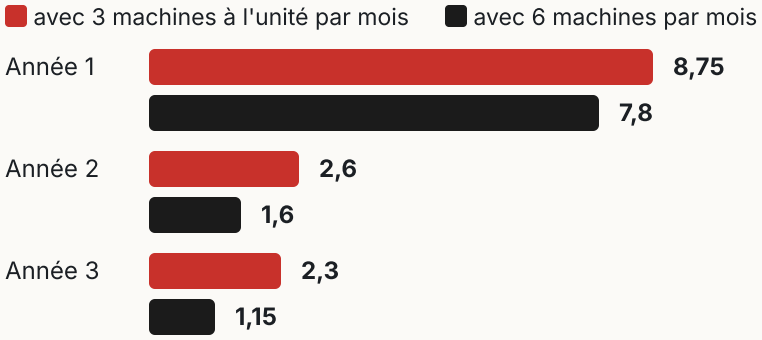

OBJECTIF	PROJETS PAR AN (3 / 6 MACHINES)	MACHINES PAR MOIS AU TOTAL (3 / 6)	VENTES DE MACHINES, M SAR PAR AN (3 / 6)
Équilibre en année 1	8,75 / 7,8	10,3 / 12,5	19,2 / 19,1
Équilibre en année 2	2,6 / 1,6	5,2 / 7,3	6,9 / 6,7
Équilibre en année 3	2,3 / 1,15	4,9 / 7,0	6,3 / 5,8
Mise récupérée en 36 mois	6,2 / 5,2	8,2 / 10,3	14,1 / 13,9

Si le showroom monte en puissance en 6 mois au lieu de 12 (clients déjà acquis, projets apportés dès l'ouverture), l'équilibre en année 1 demande 5 projets par an avec 3 machines par mois, ou 4,05 avec 6 machines par mois. Les années 2 et 3 ne changent pas.

> À maturité (un projet par mois et trois machines par mois), le showroom de Riyad est à l'équilibre dès l'année 1. En optimiste et en réaliste, il l'est en année 2 ; à l'équilibre, en année 3.

Le résultat dépend du nombre de grands projets signés

Avec 3 machines vendues à l'unité par mois, il faut environ 2,3 projets de 2 M SAR par an pour que le showroom de Riyad atteigne l'équilibre en année 3, marketing compris, et 6,2 pour récupérer la mise en 36 mois. Cette section chiffre ce que donne chaque rythme de ventes, à confronter au carnet de commandes.

CE QU'ON VEND, ET LES HYPOTHÈSES

Vente à l'unité	Une machine à 48 164 SAR en moyenne (l'offre de février 2026 vend 5 machines 240 820 SAR) plus 700 SAR d'installation.
Projet	L'ouverture d'une chaîne de boulangeries ou d'une cuisine centrale : environ 10 machines pour 2 M SAR. L'offre réelle de juillet 2025 pour une boulangerie de Riyad montait à 1,53 M SAR avant remise et 1,41 M SAR après une remise de 10 % : 2 M SAR est une hypothèse haute pour un projet seul.
Marges et commissions	35 % sur la vente unitaire et sur un projet (30 à 35 % annoncés pour le distributeur : 35 % retenu) ; commission d'agent de 10 % sur l'unitaire et 5 % sur un projet. Hypothèses.
Commercial	Un par showroom, 18 000 SAR par mois tout compris (hypothèse, sans commission), ajouté aux équipes des étapes 1 et 2.
Marketing	Équipe de deux personnes et budget de 47 000 SAR par mois à Riyad, 20 000 de plus à Jeddah, déjà inclus dans tous les chiffres.
Zones	Chaque zone vend en proportion de sa population (un agent : 60 % d'un showroom). La montée en charge est linéaire sur 12 mois ; les projets sont lissés dans le temps alors qu'en réalité ils arrivent par à-coups.

LES QUATRE SCÉNARIOS (RIYAD, À PLEIN RÉGIME)

SCÉNARIO	MACHINES PAR MOIS	PROJETS DE 2 M PAR AN	VENTES DE MACHINES, M SAR	LECTURE
À l'équilibre	3	2,3	6,3	Le seuil où l'étape 1 couvre ses coûts en année 3 : un projet tous les 5 mois
Réaliste	3	4	9,7	Un projet tous les 3 mois
Optimiste	6	6	15,5	Un projet tous les 2 mois
À maturité	3	12	25,7	Un projet par mois et 3 machines par mois : le rythme de croisière visé

Étape 1 seule : Riyad

SCÉNARIO	RÉSULTAT ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3	CA ANNÉE 3	ÉQUILIBRE MENSUEL	MISE RÉCUPÉRÉE EN 36 MOIS
À l'équilibre	−1,74	−0,20	+0,03	7,44	Mois 29	Non (−6,76 au mois 36)
Réaliste	−1,28	+1,03	+1,33	10,95	Mois 11	Non (−3,85 au mois 36)
Optimiste	−0,49	+3,22	+3,73	17,08	Mois 8	Mois 32
À maturité	+0,88	+6,83	+7,46	27,48	Mois 6	Mois 20

Résultats avec une marge de 35 % sur la vente unitaire et sur les projets (à 30 %, ils sont plus bas de 0,5 à 1,3 M SAR en année 3 selon le scénario). Le chiffre d'affaires inclut les machines, l'installation, le SAV, les formations, les masterclasses et la location de salle ; ces trois derniers sont les mêmes dans tous les scénarios.

Avec Jeddah et les agents

SCÉNARIO	CA ANNÉE 3, ÉTAPES 1-2	RÉSULTAT ÉTAPES 1-2	CA ANNÉE 3, ÉTAPES 1-3	RÉSULTAT ÉTAPES 1-3	RÉSEAU COMPLET, ANNÉE 2
À l'équilibre	15,63	+0,75	16,85	+1,11	−1,27
Réaliste	23,47	+3,55	25,35	+4,11	+0,52
Optimiste	37,02	+8,57	40,01	+9,45	+3,66
À maturité	60,37	+16,72	65,33	+18,21	+8,95

À maturité, le réseau complet vend pour plus de 60 M SAR par an : c'est une extrapolation mécanique (chaque zone vend au prorata de sa population), à confronter au nombre d'ouvertures réellement attendues. La mise est récupérée en 36 mois en optimiste (mois 32 pour l'étape 1, mois 34 pour les étapes 1 à 3) et à maturité (mois 20 et mois 25) ; pas dans les deux autres scénarios.

Agent à commission : formule écartée. La politique commerciale de Bongard ne permet plus cette formule ; les chiffres correspondants sont retirés du dossier.

Combien de projets par an ? (3 machines par mois)

OBJECTIF	PROJETS DE 2 M SAR PAR AN (RIYAD)
Équilibre en année 3, étape 1	2,3
Équilibre en année 3, étapes 1 et 2	1,85
Équilibre en année 3, étapes 1 à 3	1,7
Mise récupérée en 36 mois, étapes 1 à 3, autonome	6,2

Pour choisir le scénario de départ, nous devons arrêter une donnée simple : combien de projets de 10 machines (ouvertures de boulangeries, cuisines centrales) sont signés ou en cours en Arabie saoudite sur les 12 derniers mois, à quel prix ?

Deux manières d'entrer dans le projet

Un partenaire local peut entrer en distributeur autonome ou en joint-venture. Un troisième scénario, l'agent à commission, est écarté : la politique commerciale de Bongard ne le permet plus. Chacune des deux formules répartit différemment l'investissement, le risque et les profits.

SCÉNARIO	QUI APPORTE QUOI	QUI PREND LE RISQUE	CE QUE LE PARTENAIRE TOUCHE
A. Distributeur autonome	Le partenaire finance showroom, stock de machines, pièces et SAV ; il achète les machines à Bongard France et les revend avec une marge de 35 % (30 à 35 % annoncés, 35 % retenu)	Le partenaire	La marge de revente, après remboursement de l'investissement
B. Joint-venture	Société locale détenue ensemble par BME et le partenaire ; le partenaire apporte une part du financement (100 %, 50 % ou 30 %) ; BME Dubaï n'apporte pas d'espèces et cède l'exclusivité à la société de Riyad. Arrêté : le partenaire qui finance 100 % a 50 % du capital, gouvernance 50/50, cession de l'exclusivité pour toute l'Arabie saoudite confirmée par écrit ; l'opération est menée par l'équipe de direction	Au prorata du financement	Dividendes et plus-value au prorata

Scénarios A et B : un partenaire qui devient le distributeur. Le résultat dépend du volume, pas de la structure : avec 3 machines par mois, le showroom de Riyad atteint l'équilibre en année 3 à partir d'environ 2,3 projets par an et récupère sa mise en 36 mois à partir de 6,2.

Scénario B : le partenaire finance une part. Une part du financement n'est pas une part du capital, parce que la marque et l'exclusivité ont une valeur ; pour un financement à 100 %, la répartition arrêtée est 50/50. Montants à engager (SAR) :

PART FINANCÉE PAR LE PARTENAIRE	ÉTAPE 1	ÉTAPES 1 ET 2	ÉTAPES 1 À 3
100 %	5 418 360	9 845 460	10 145 460
50 %	2 709 180	4 922 730	5 072 730
30 %	1 625 508	2 953 638	3 043 638

Pour chaque scénario, il reste à arrêter : la sortie en cas de désaccord et le sort du showroom et des stocks si un partenaire se retire.

Conditions d'achat. Un tarif public ex-works France sera disponible, avec un barème de remise selon les 4 familles d'équipements Bongard. La société de Riyad importe directement depuis la France, sans passer par les Émirats (SABER, etc.) : Bongard France facture Bongard Riyad, qui facture ensuite ses clients. Paiement : 30 % à la commande, le solde de 70 % entre 30 et 45 jours, sur les équipements et les pièces détachées. La TVA est la TVA saoudienne.

15 · POINTS À VALIDER

Onze points : dix arrêtés, un ouvert

Les réponses du partenaire de Dubaï arrêtent dix points. Reste le volume de ventes, qui permet de choisir le scénario de départ.

1. **Marge ou commission réelle**
   ARRÊTÉ · 35 % sur la vente unitaire et sur un projet (30 à 35 % annoncés ; calculs à 35 %, 30 % en borne basse).

2. **Volume de ventes**
   OUVERT · ventes déjà réalisées et pipeline en Arabie saoudite, pour fixer le rythme de ventes attendu à Riyad.

3. **Qui facture**
   ARRÊTÉ · Bongard France facture Bongard Riyad, qui facture ses clients ; TVA saoudienne ; 30 % à la commande, solde de 70 % entre 30 et 45 jours.

4. **Contribution de BME Dubaï**
   ARRÊTÉ · pas d'apport en espèces ; BME Dubaï cède l'exclusivité à la société de Riyad.

5. **Répartition du capital**
   ARRÊTÉ · 50/50 pour le partenaire qui finance 100 %.

6. **Exclusivité**
   ARRÊTÉ · cession pour toute l'Arabie saoudite, confirmée par écrit.

7. **Gouvernance**
   ARRÊTÉ · 50/50.

8. **Pièces détachées**
   ARRÊTÉ · stock de 430 000 SAR pour l'ensemble des marques.

9. **Coût du responsable actuel**
   ARRÊTÉ · 285 400 SAR par an, compté dans les deux formules.

10. **Marketing**
    ARRÊTÉ · budget de 25 000 SAR par mois à Riyad ; BME Dubaï ne prend rien en charge ; comptabilité tenue par un comptable saoudien.

11. **Chocolat**
    ARRÊTÉ · l'exclusivité de la marque de chocolat prévue au départ est prise ; BME Dubaï travaille sur une autre marque.
